

PRO-ACTION DEVELOPPEMENT

RAPPORT D'ACTIVITÉS HAITI 2019





NOTRE PROGRAMME EN HAÏTI

Le « **Programme d'amélioration du secteur Eau Potable, Hygiène et Assainissement dans le département de la Grand'Anse en Haïti** » est mené en partenariat avec la Fondation Im@gine depuis 2012. Il cible le département de la Grande Anse situé au sud-est de l'île et s'adresse à l'ensemble de la population du département.


L'**objectif global** du programme est **l'amélioration durable de l'état de santé des populations** du département de la Grande Anse en Haïti, qui participe à l'amélioration globale de leurs conditions de vie à travers diverses retombées économiques et sociales.

Les **objectifs spécifiques**, quant à eux, sont :

- l'amélioration durable des comportements liés à la consommation de l'eau et à l'hygiène à travers des activités de sensibilisation/ formation.
- l'amélioration de l'environnement sanitaire par la construction d'ouvrages sanitaires et hydrauliques



Le programme et les actions se déclinent en 5 volets :

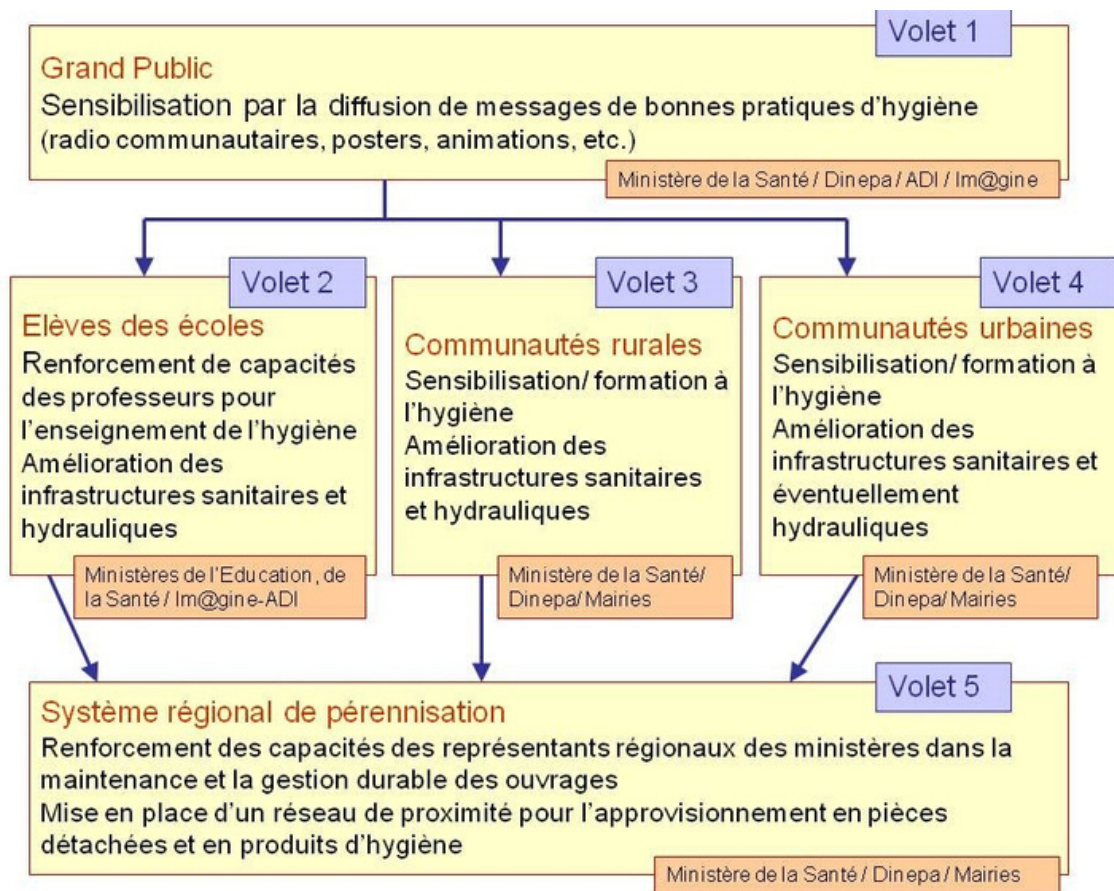

Chronologie

- **2012** : Démarrage du programme avec le 1^e volet de sensibilisation du grand public. Enregistrement et début de la diffusion de spots radio sur l'ensemble du département de la Grande Anse.
- **2013** : Enquête initiale effectuée sur Corail pour identifier les besoins ; début des animations dans les Mornes ; formation aux méthodes participatives sur Corail, pour les animateurs et pour les autres acteurs de la Grand'Anse. Suite à cette formation, les animateurs ont adapté la formation au contexte haïtien et ont lancé le volet 2 dans les premières écoles.
- **2014** : Les premiers PHAST ont débuté dans les localités rurales de la première et de la deuxième section.
- **2015** : Constructions des premières latrines.
- **2016** : Passage de l'ouragan Matthew sur Corail. Gestion d'urgence de l'accès à l'eau potable par l'équipe de PAD afin d'éviter la propagation du choléra.
- **2017** : Reprise des activités de PAD à un rythme limité ; reconstruction des bâtiments prioritaires.
- **2018** : Construction des premières latrines à déshydratation ECOSAN dans le centre-ville de Corail, une première dans le département.

2019 EN QUELQUES LIGNES

2019 a été une année plutôt mouvementée : les difficultés économiques, les manifestations et les troubles à l'ordre public (et aux transports) liés notamment à l'inflation fulgurante dans le pays ont quelque peu perturbé la cadence du projet tout au long de l'année et même ralenti fortement celui-ci entre septembre et décembre.

L'augmentation du prix et la difficulté d'approvisionnement du/en carburant ont à la fois rendu l'acheminement des matériaux à Corail parfois difficile et très long mais ont aussi conduit à une hausse du prix du ciment et d'autres matériaux, indispensables pour la construction des ouvrages sanitaires et hydrauliques. La plupart des écoles de Corail ont été fermés quelques semaines en début d'année et n'ont pas ouvert leurs portes en septembre et ce jusque décembre.

Par ailleurs, les financements ont tardé à arriver ; ce qui a contraint le siège à recommander à l'équipe locale d'arrêter les chantiers pendant l'été afin de pouvoir boucler l'année sans devoir trop puiser dans les fonds propres de l'association.

Malgré ces conditions difficiles, l'engagement des communautés haïtiennes n'a pas faibli pour le projet et cela n'a fait que renforcer la motivation de notre équipe sur place. Quatre localités supplémentaires sont ainsi entrées dans le projet en 2019 et 147 latrines ont été construites. Une citerne scolaire a été construite et une autre était en cours de finalisation à la fin de l'année. Des « refresh » ont également été faits sur le lavage des mains dans plusieurs écoles de Corail en début d'année 2019.



2019 : LES RÉSULTATS

Indicateur	Objectif 2019	Résultats 2019
Volet 1		
Ecriture enregistrement de nouveaux spots	8	0
Diffusion des spots	8/jour	-
Volet 2		
PHAST	4	4
Leadership comité	4	0
Formation enseignants	40	0
Formation club	4	0
Réunion interclub	1	0
Formation comité utilisation	8	0
Construction blocs latrines	4	0
Construction ouvrages hydrauliques (citernes)	4	1
Volet 3		
Localités	16	4
Latrines	800	147
Point d'eau	3 aménagement de source	0 aménagement de source
PHAST	880 personnes (48 groupes)	160
Formations Comités	19	4



2019 : DETAILS DES REALISATIONS

GRAND PUBLIC

En 2019, les 22 spots créés par l'association au début du programme n'ont pas pu être diffusés sur la radio Im@gine car celle-ci n'a pas pu émettre en raison de problèmes techniques. La radio n'émettant pas, les nouveaux spots n'ont pas été enregistrés.

DANS LES ECOLES

Il était prévu en 2019 d'intervenir dans 4 nouvelles écoles et d'y construire dans chacune un bloc latrine et un système de récupération d'eau de pluie. Cependant, en raison de la situation compliquée des écoles haïtiennes pendant l'année, l'équipe n'a pas pu atteindre les objectifs fixés.

Elle a cependant effectué un refresh sur le lavage des mains dans quelques écoles en début d'année et une citerne a été construite dans l'école de Baie-Trinette. Les matériaux ont également été livrés en fin d'année à l'école nationale d'Astier mais la construction n'a pas pu démarrer avant début 2020.



DANS LES COMMUNAUTES

Il était prévu en 2019 : de construire 800 latrines et d'aménager 3 sources ; de renforcer les synergies avec les autres opérateurs dans le domaine de l'eau ; et de poursuivre la construction de 80 latrines à déshydratation dans le centre-ville de Corail.

En raison de la hausse du prix des matériaux et d'un budget très serré en fin d'année, l'équipe n'a pas pu assurer la construction de tous les ouvrages sanitaires et hydrauliques prévus.

147 latrines ont été construites, réparties sur 7 localités rurales de Corail. Quatre nouvelles localités ont rejoint le projet et leurs habitants ont suivi une formation PHAST au cours de l'année 2019. Certains d'entre eux sont désormais bénéficiaires d'une latrine ; les autres suivront en 2020.

Aucun point d'eau n'a été aménagé ou construit, en raison à la fois de la hausse du prix des matériaux mais également de l'attente de la reconnaissance officielle de l'association par la DINEPA. Le contexte politique du pays n'a pas été favorable dans l'avancement de ce dossier important.





CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020

Le projet a connu en 2019 un ralentissement de son rythme en raison de la crise politique, économique et sociale que traverse Haïti depuis juillet 2018. L'inflation importante du carburant et du prix des matériaux a compliqué la poursuite des chantiers pour les ouvrages sanitaires et hydrauliques et les fermetures fréquentes des écoles ont empêché la formation de nouveaux enseignants et élèves.

Cependant, l'équipe a continué de recevoir des demandes de la part de nombreux habitants, preuve que les communautés bénéficiaires se montrent satisfaites de leur ouvrage, rendant les villages voisins désireux à leur tour de se mobiliser et de s'inscrire dans une démarche similaire.

Par ailleurs, quelques financements obtenus dès le mois de septembre 2019 ont permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le projet en 2020. En effet, il est prévu d'étendre le programme Eau, Hygiène et Assainissement sur la commune de Pestel, de poursuivre la construction de latrines à déshydratation ECOSAN dans les zones géologiques où elles sont une solution idéale.

L'année 2020 sera aussi une année consacrée à la mise en place d'un premier terrain maraîcher d'expérimentation pour y cultiver des légumes et fruits locaux en y utilisant et valorisant des engrais organiques issus des dérivés de latrines Ecosan. Les écoles ne seront pas non plus en reste puisqu'un financement prévoit la réalisation de pépinières scolaires et de zones de tri des déchets dans une dizaine d'écoles dans le cadre du projet pédagogique World Youth for Climate, projet de sensibilisation aux enjeux Nord-Sud en termes de changements climatiques.

La pandémie de Covid 19 et les difficultés sociales et économiques qui pourront en découler constituent ici aussi des hypothèses majeures de ralentissement des activités. Cependant, comme pour le Burundi, la confiance et les contacts entre le projet et les bénéficiaires seront des éléments déterminants dans la gestion de la crise, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Les **perspectives pour 2020** sont reprises dans le tableau suivant :

Activités	Prévision 2020
VOLET 1	
Nouveaux spots	3
Diffusion des spots	8/ jour
VOLET 2	
PHAST	2
Leadership comité	2
Formation Enseignant	2
Formation club	2
Réunion interclub	1
Formation comité utilisation	2
Latrines et urinoirs	4 blocs
Citernes	1
Pépinières scolaires	11
Zones de tri des déchets	11
VOLET 3	
Latrines arborloo	150
Latrines Ecosan	80
Points d'eau	4 (1 source, 2 forages et 1 citerne)
Animations PHAST	10 localités
CHA	10
CPE	4
Micro-périmètres maraichers	2
Zones de traitement Ecosan	2

ACCRONYMES :

EAH : Eau Assainissement Hygiène

CHA : Comité Hygiène et Assainissement

CPE : Comité Point d'Eau

AGR : Activité Génératrice de Revenu

PHAST: Participatory Hygiene And Sanitation Transformation

WAST : Waste and Sanitation Transformation



PAD Belgique
Rue Camille Cals, 24
5030 Ernage
Tél : +32 81 600 125
laura@proactiondev.org
<http://www.proactiondev.org>

PAD Haiti
rue père Benier
Corail – BP 10
Jérémie
(+509) 38 34 09 70
padhaiti@proactiondev.org

